

125-19.61

Santiago de Cali, 09 de octubre de 2017

CACCI 6350

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 323 DC-13-2017

OFI17-00002550 / JMSC 110300 Secretaria Transparencia Presidencia.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades administrativas en el Municipio de Roldanillo -Valle, inherentes al abandono del acueducto de los corregimientos de Higueroncito y Morelia, obra que se inauguró hace 2 años con un costo cercano a los \$3.500 millones y no ha funcionado ni un solo día, expuesta al deterioro y sin prestar servicio a la comunidad, que espero este servicio desde hace varias décadas.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana inicialmente remitiéndola a la Dirección Operativa de Control Fiscal para ser atendida en el proceso auditor que se realiza al Municipio de Roldanillo.

Posteriormente en el proceso auditor se solicitó apoyo técnico a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

De la visita Técnica realizada al municipio de Roldanillo se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias ciudadanas y peticiones allegadas a este Ente de Control Fiscal.

De acuerdo con lo anterior, se efectúa visita fiscal para atender la denuncia DC-13-2017 para lo cual se solicita la información relacionada con el tema de la denuncia con el fin de tener conocimiento más amplio sobre los hechos materia de la denuncia y recolección de la información requerida.

Se encargó de realizar a visita técnica la Ingeniera Sanitaria, adscrita a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente; quien tuvo en cuenta para el desarrollo

del informe la normatividad legal vigente y toda la documentación e información recopilada.

El resultado final de la visita es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder a los requerimientos de los denunciantes.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Brindar el apoyo técnico a lo solicitado en la denuncia radicada según CACCI -323 DC 13-2017 y remitida por la Secretaría de Transparencia- Presidencia de la República a través del oficio OFI17-00002550/JMSC 110300, e interpuesta por un ciudadano del Corregimiento de Higueroncito, mediante la cual denuncia ***“presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos del contrato cuyo objeto fue construcción del acueducto de los corregimientos de Higueroncito y Morelia en el Municipio de Roldanillo”***.

3. LABORES REALIZADAS

Para atender la denuncia ciudadana, se realizó visita técnica al Municipio de Roldanillo y específicamente al Corregimiento de Higueroncito, y se realizó revisión documental con la información que reposa en la alcaldía del Municipio de Roldanillo.

4. RESULTADO DE LA VISITA

Analizada la información recibida se obtuvo el siguiente resultado:

CONCEPTO TECNICO DENUNCIA N° 13-2017

El proyecto de construcción del acueducto de los corregimientos de Higueroncito y Morelia en el Municipio de Roldanillo, se enmarco dentro del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico PDA Valle del Cauca. Este proyecto beneficiaría a 700 familias.

Mediante proceso de Licitación Pública N° VA-006-2012 fue adjudicado el contrato a la firma Consorcio Acueducto VYG mediante contrato VA-04-01-03-069-2012.

De igual manera se contrató la interventoría mediante proceso de concurso de méritos N° VA-005-2012 adjudicada a la firma Consorcio Juan S, mediante contrato VA-04-01-06.063-2012.

Según el informe del interventor, técnicamente el proyecto estaba concebido de la siguiente manera: inicia a la salida de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de La Unión, con una línea de conducción de 10”, posteriormente llega a una estación de macromedición y cierre automático donde inicia una línea de conducción de aproximadamente 8 km en tubería PVC en diámetros de 8” y 6” con sistema de purga y ventosa para el funcionamiento eficiente del sistema y se distribuye por redes a los Corregimientos de Higueroncito y Morelia.




Fuente: informe interventoría para pago final

Las obras ejecutadas asciende a Tres Mil Setecientos Trece Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos mcte (\$3.713.459.021)

Valor Contrato	Obra civil	Interventoría	Total
Valor inicial Contrato	2.880.917.659	201.673.656	3.082.591.315
Adicional en valor 1	172.855.060	12.099.854	184.954.914
Adicional en valor 2	530.348.354	37.133.739	567.482.093
Adicional en valor 3	129.337.948	9.055.145	138.393.093
Valor final contrato	3.713.459.021	259.962.394	3.973.421.415

El problema con el proyecto se presentó por que no fue posible empalmar la conducción La Unión-Morelia de 8" con la tubería existente de 10", la cual viene de la Planta de Tratamiento de Acueducto del Municipio de La Unión, dado que esta tubería no está en funcionamiento, se debió empalmar entonces a un tubería de 3", condición que restringe la operación del sistema ya que presenta disminuciones drásticas de caudal y presión.

EMPALME EN K0+000

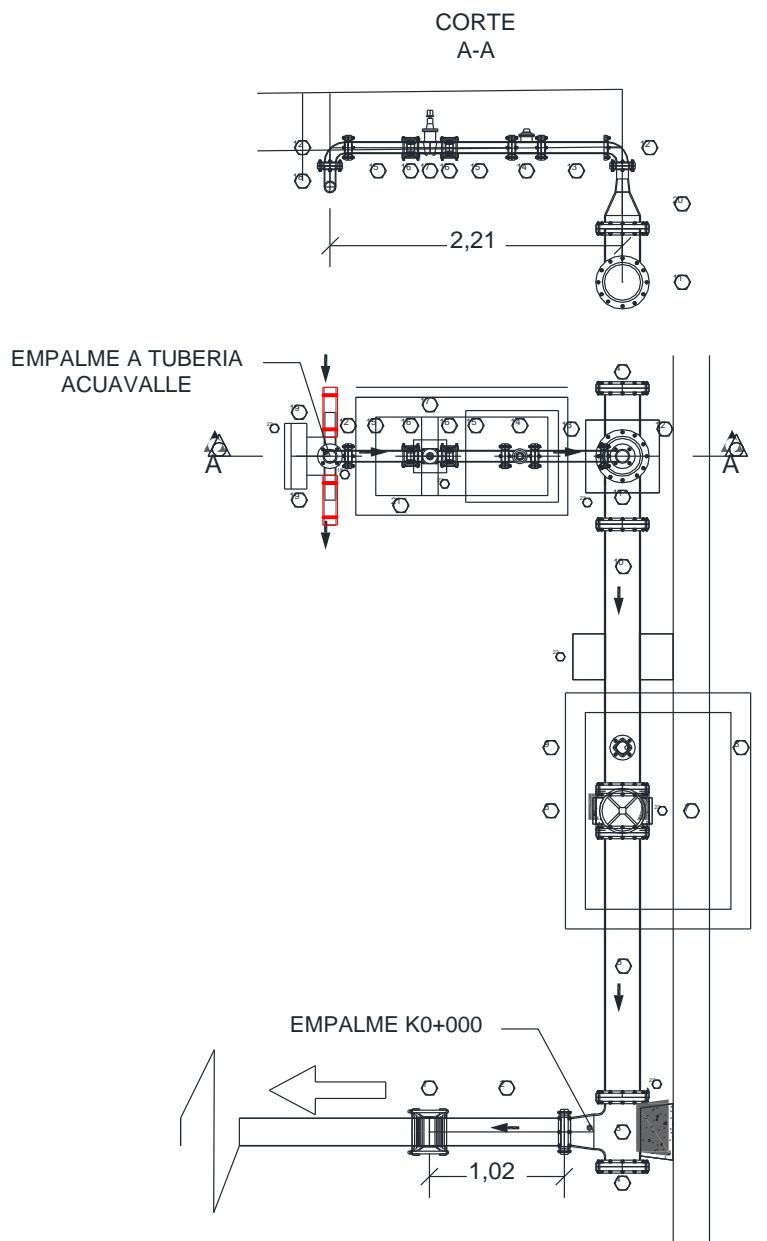

EMPALME EN K0+000 DE RED ACUAVALLE PVC 3" CON PVC 8" BIAXIAL DEL PROYECTO

DESPIECE DE ACCESORIOS		
No.	DESCRIPCION	CANT.
1	UNION ACOPLE UNIVERSAL 8" R1	1
2	NIPLE ACERO SCH 40 D=8" BRIDA X EXTREMO LISO L=1.02 MT	1
3	TEE ACERO SCH 40 10" X 10" X 8" BRIDADA	1
4	BRIDA CIEGA ACERO SCH 40 X 10"	2
5	NIPLE 10" HD O ACERO SCH 40 BRIDA x BRIDA L=2.02 m	1
6	VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO 10" BRIDA X BRIDA	1
7	TUBO ASBESTO CEMENTO D=10"	
8	CAJA EN CONCRETO PARA VALVULA 10"	1
9	VENTOSA TRIPLE ACCION	1
10	NIPLE 10" HD O ACERO SCH 40 B X B L=2.02 m CON SALIDA PARA VENTOSA	1
11	TEE ACERO SCH 40 10" X 10" X 10" BRIDADA	1
12	CODO HD O ACERO SCH 40 DE 3" BRIDA x BRIDA	2
13	NIPLE HD O ACERO SCH40 DE 3" BRIDA x BRIDA	1
14	MACROMEDIDOR VOLUMETRICO D=3" BRIDA X BRIDA	1
15	NIPLE HD O ACERO SCH40 DE 3" BRIDA X EXTREMO LISO	2
16	UNION ACOPLE UNIVERSAL 3" R1	2
17	VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO 3" EXTREMO LISO	1
18	TEE ACERO SCH 40 3" X 3" X 3" BRIDA X EXTREMO LISO	1
19	UNION RAPIDA PVC 3"	2
20	REDUCCION HD O ACERO SCH 40 10" X 3" BRIDA X BRIDA	1
21	CAJA EN CONCRETO 1.60 X 0.90 MTS PARA VALVULA 3" Y MACROMEDIDOR VOLUMETRICO	1
22	ANCLAJES EN CONCRETO	

Es decir, las condiciones del diseño inicial del empalme K0+000 fueron modificadas, ya que al momento de realizar la inspección para el empalme, se encontró que la tubería de 10" del Acueducto del Municipio de la Unión de la cual se conectaba el proyecto estaba fuera de servicio, adicionalmente se habían realizado conexiones erradas de alcantarillado, lo que imposibilitaban realizar la respectiva conexión. Esto generó que se realizará el empalme a una línea de distribución de 3". Este cambio en las condiciones de empalme obligo a instalar un equipo de bombeo para potencializar el sistema y garantizar el llenado del tanque de almacenamiento en el corregimiento de Morelia. Esta modificación fue aprobada y viabilizada por el Ministerio

Según el acta de entrega que reporta en la carpeta, la obra fue entregada el 10 de junio de 2015 al Municipio, pero hasta la fecha no ha entrado en funcionamiento.





Registro fotográfico de la entrega del Acueducto a la administración anterior

El 28 de diciembre de 2015, el Municipio de Roldanillo firma un contrato de operación por 20 años con la empresa Aquahiguerones S.A. E.S.P. Contrato que nunca se ejecutó. Es importante resaltar que todos los documentos del proceso licitatorio que dio origen al contrato, el acto de apertura del proceso licitatorio, el informe de evaluación de ofertas y el acto administrado de adjudicación del contrato, se encuentran sin firmas.

Debido a que la actual administración Municipal encontró varias inconsistencias en el proceso contractual, cito a la empresa Aquahiguerones a una audiencia de trámite de incumplimiento contractual, donde se determinó determinar bilateralmente el contrato.

Posteriormente, el 8 de febrero del 2017 el Municipio firmó un convenio interadministrativo con Acuavalle para la operación. Pero previamente se deben hacer una serie de actividades y evaluaciones a fin de garantizar el suministro de agua potable las 24 horas del día a estas poblaciones

El 19 de septiembre de 2017 se realizó reunión en las instalaciones de Vallecaucana de Aguas, entre la Contraloría Departamental, diseñador del proyecto, el gestor Vallecaucana, contratista e interventor, se revisó técnicamente el proyecto, evidenciado su viabilidad para abastecer la población.

El 22 de septiembre se realizó visita al acueducto de los corregimientos de Higueroncito y Morelia en compañía de Alcalde Municipal, Secretario de infraestructura, Vallecaucana de Agua, Diseñador, Contratista, Interventor, Acuavalle operador actual, donde se evidenció que:



- Las instalaciones del acueducto: estaciones de control, estaciones de bombeo, tanque de almacenamiento se encuentra en estado de abandono, enmalezados.





Registro fotográfico de las instalaciones del acueducto

- Se evidenció que todo los elementos que componen el sistema se encuentran instalados (bombas, macromedidores, válvulas, etc.)



- Los usuarios tiene instalados los medidores, en algunos casos falta las conexiones internas.



5. CONCLUSIONES

1. No se puede establecer el impacto del proyecto debido a que aún el acueducto, no se encuentra en funcionamiento.
2. La Administración Municipal y el Operador Acuavalle se comprometieron a enviar el cronograma de puesta en marcha y funcionamiento de la planta de tratamiento de Morelia e Higueroncito, antes del 6 de octubre de 2017 a la Contraloría Departamental del Valle.
3. Es necesario realizar seguimiento por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca al cumplimiento de este cronograma, como el correcto funcionamiento del acueducto, teniendo en cuenta que la población de estos corregimientos actualmente se le está suministrado agua de pozo, que no es apta para el consumo humano.
4. El presente concepto es consolidado con el concepto parcial entregado el 9 de mayo de 2017 al coordinador de la auditoria de Roldanillo.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-13-2017.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del



correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 323 DC-13– 2017

Martha Rosmery Castrillón R.-Secretaria General CDVC Piso 5 DP No.277 de 18/01/17

Luisa Fernanda Mora M. Asesora Secretaria de Transparencia Presidencia de la Republica- Calle 7 No. 6-54 Bogotá D.C Código Postal 111711.

vivianacardenas@cdvc.gov.co

alcaldia@roldanillo-valle.gov.co

Transcribió: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada.
